

# Visualisieren Sie Ihren Bauzeitenplan mit einem Gantt-Diagramm!

Posted on 30. Juni 2026 by Benoit

Die Gantt-Ansicht bietet Ihnen einen Überblick über den Fortgang Ihres Projekts.


Diese Funktion ist in Archipad App und Archipad Cloud verfügbar.

---

## Archipad App

So greifen Sie auf die **Gantt**-Ansicht in Archipad App zu:

1. Öffnen Sie das Menü „Bauzeitenplan“,
2. Die Ansicht „Ereignisse“ wird angezeigt,
3. Drücken Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Schaltfläche „Ansicht“,
4. Wählen Sie die Option Gantt aus den verfügbaren Optionen aus.

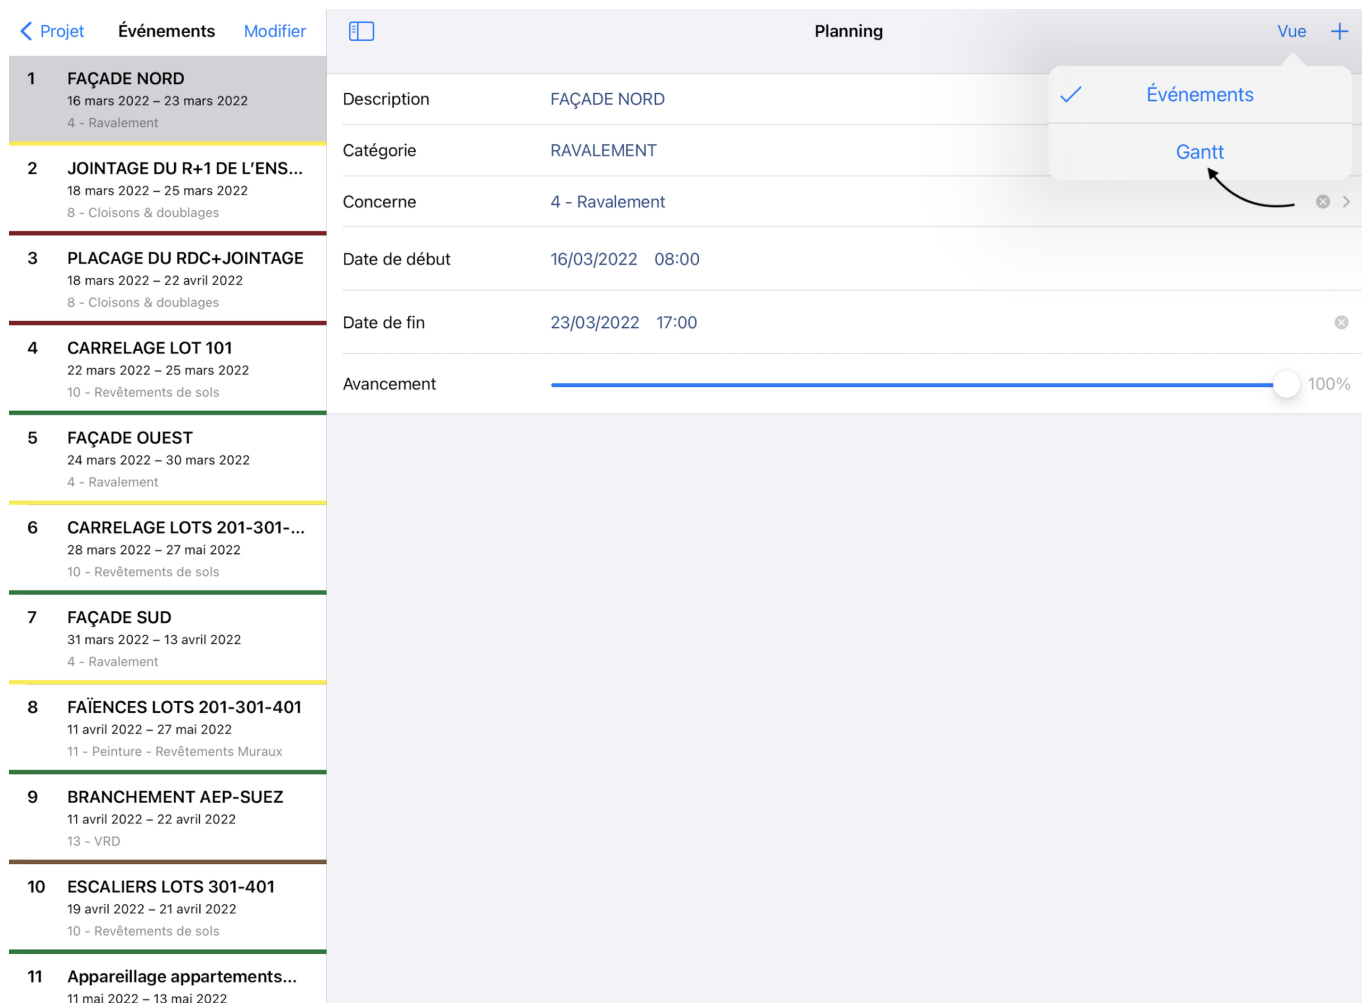


The screenshot displays the Archipad interface for managing a construction project. On the left, a list of 11 tasks is shown, each with a number, title, dates, and category. The main area on the right is titled 'Planning' and shows a Gantt chart view. A dropdown menu is open, showing 'Événements' (selected) and 'Gantt'. The Gantt chart shows a single bar for the first task, 'FAÇADE NORD', with a progress indicator at 100%.

| Task ID | Task Name                    | Start Date    | End Date      | Category                           |
|---------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1       | FAÇADE NORD                  | 16 mars 2022  | 23 mars 2022  | 4 - Ravalement                     |
| 2       | JOINTAGE DU R+1 DE L'ENS...  | 18 mars 2022  | 25 mars 2022  | 8 - Cloisons & doublages           |
| 3       | PLACAGE DU RDC+JOINTAGE      | 18 mars 2022  | 22 avril 2022 | 8 - Cloisons & doublages           |
| 4       | CARRELAGE LOT 101            | 22 mars 2022  | 25 mars 2022  | 10 - Revêtements de sols           |
| 5       | FAÇADE OUEST                 | 24 mars 2022  | 30 mars 2022  | 4 - Ravalement                     |
| 6       | CARRELAGE LOTS 201-301-...   | 28 mars 2022  | 27 mai 2022   | 10 - Revêtements de sols           |
| 7       | FAÇADE SUD                   | 31 mars 2022  | 13 avril 2022 | 4 - Ravalement                     |
| 8       | FAÏENCES LOTS 201-301-401    | 11 avril 2022 | 27 mai 2022   | 11 - Peinture - Revêtements Muraux |
| 9       | BRANCHEMENT AEP-SUEZ         | 11 avril 2022 | 22 avril 2022 | 13 - VRD                           |
| 10      | ESCALIERS LOTS 301-401       | 19 avril 2022 | 21 avril 2022 | 10 - Revêtements de sols           |
| 11      | Appareillage appartements... | 11 mai 2022   | 13 mai 2022   |                                    |

Sie haben zwei Möglichkeiten, um zur Ansicht „Ereignisse“ zu gelangen:

Die erste Möglichkeit besteht darin, die Option „Ereignisse“ über die Schaltfläche „Ansicht“ oben rechts auf dem Bildschirm zu wählen.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, oben links auf die Schaltfläche „Ereignisse“ zu drücken.

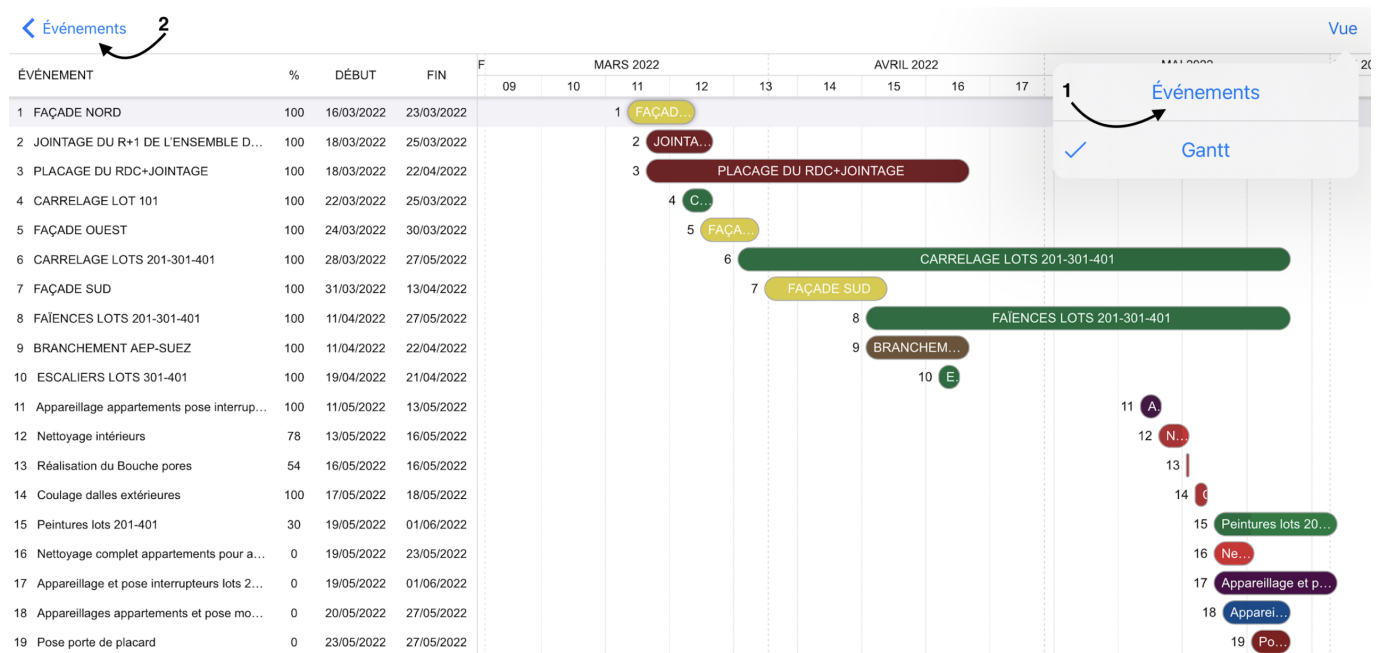

In der Gantt-Ansicht finden Sie die folgenden Elemente:

- Der Index Ihres Ereignisses zusammen mit dem Titel.
- Der Fortschrittsstand Ihres Ereignisses in Prozent.
- Das Startdatum und das Enddatum für Ihr Ereignis.

## Wichtig zu wissen:

Ereignisse, die nur ein Startdatum haben, werden durch eine Raute symbolisiert.


Ereignisse mit einem Enddatum, das mit dem Startdatum identisch ist, werden in sehr kompakter Form dargestellt.

Die Anzeige der Zeitleiste (zeitliche Informationen: Monat, Jahr usw.) wird basierend auf der Gesamtdauer der Ereignisse bestimmt.

## Archipad Web

So greifen Sie auf die **Gantt**-Ansicht in Archipad Web zu:

1. Öffnen Sie das Menü „Bauzeitenplan“,
2. Die Ansicht „Ereignis“ wird angezeigt,
3. Klicken Sie oben links auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Gantt“.

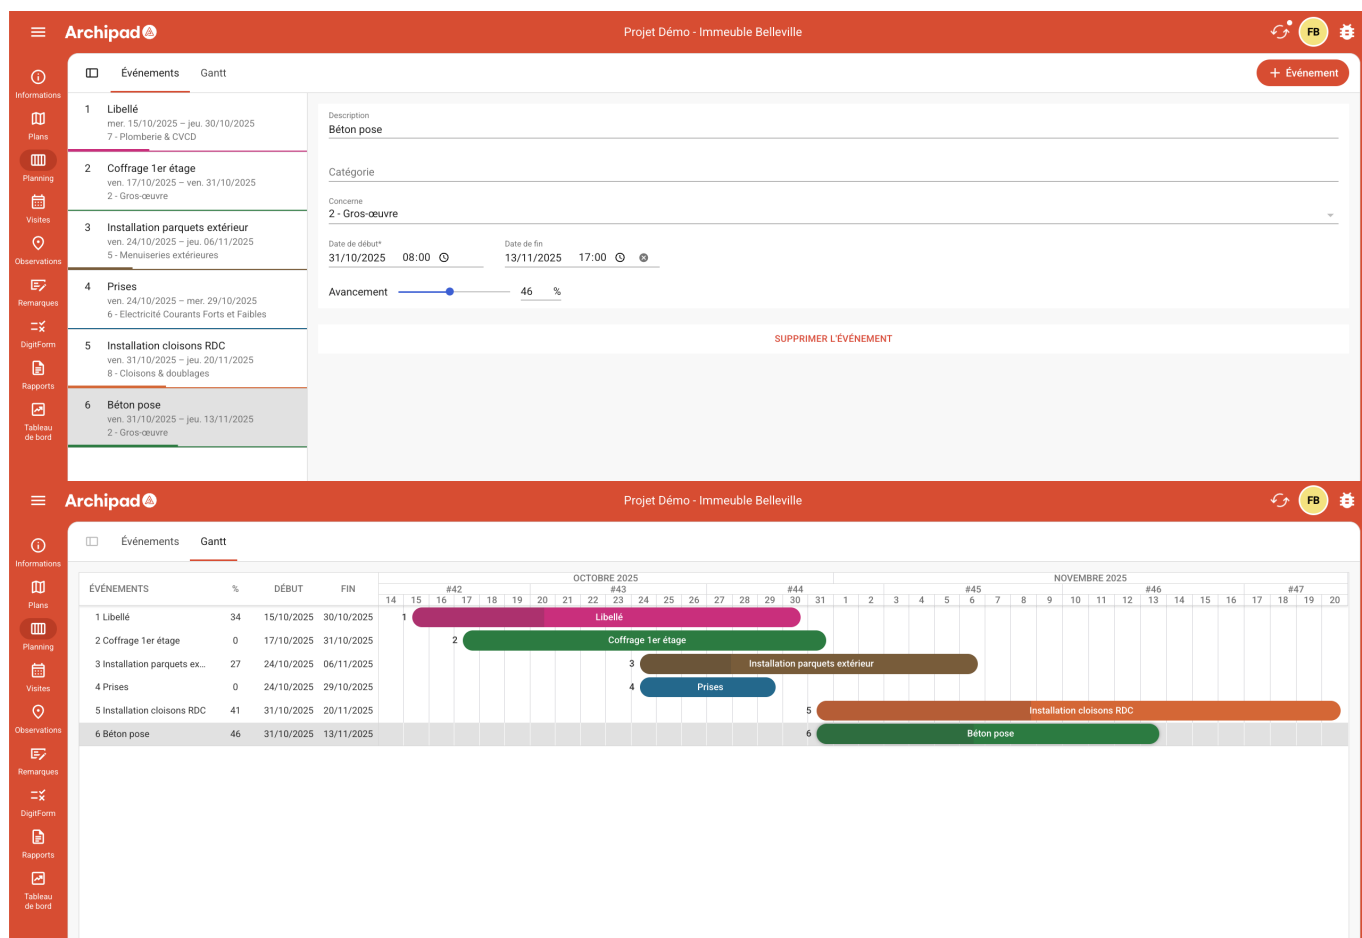

The screenshot displays the Archipad Web interface for a project named "Projet Démo - Immeuble Belleville". The interface is divided into two main sections: a list of events on the left and a detailed Gantt chart on the right.

**Top Section (Event List):**

- Libellé**: mer. 15/10/2025 – jeu. 30/10/2025, 7 - Plomberie & CVCD
- Coffrage 1er étage**: ven. 17/10/2025 – ven. 31/10/2025, 2 - Gros-œuvre
- Installation parquets extérieur**: ven. 24/10/2025 – jeu. 06/11/2025, 5 - Menuiseries extérieures
- Prises**: ven. 24/10/2025 – mer. 29/10/2025, 6 - Electricité Courants Forts et Faibles
- Installation cloisons RDC**: ven. 31/10/2025 – jeu. 20/11/2025, 8 - Cloisons & doublages
- Béton pose**: ven. 31/10/2025 – jeu. 13/11/2025, 2 - Gros-œuvre

**Right Section (Gantt Chart):**

The Gantt chart shows the timeline for the selected event "Béton pose". It includes a progress bar indicating 46% completion. The timeline spans from 31/10/2025 08:00 to 13/11/2025 17:00. A button "SUPPRIMER L'ÉVÉNEMENT" is visible below the progress bar.

**Bottom Section (Gantt Chart Overview):**

The bottom section provides a broader view of the project timeline, showing the Gantt chart for all events. The timeline is divided into months (OCTOBRE 2025 and NOVEMBRE 2025) and days. The events are color-coded and labeled with their respective progress percentages.

| ÉVÉNEMENTS                    | %  | DÉBUT      | FIN        |
|-------------------------------|----|------------|------------|
| 1 Libellé                     | 34 | 15/10/2025 | 30/10/2025 |
| 2 Coffrage 1er étage          | 0  | 17/10/2025 | 31/10/2025 |
| 3 Installation parquets ex... | 27 | 24/10/2025 | 06/11/2025 |
| 4 Prises                      | 0  | 24/10/2025 | 29/10/2025 |
| 5 Installation cloisons RDC   | 41 | 31/10/2025 | 20/11/2025 |
| 6 Béton pose                  | 46 | 31/10/2025 | 13/11/2025 |
